



## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client: EARL DE LA COYERE

Maître d'oeuvre: IGEFOR

Lieu de l'ouvrage : La coyere

53290 BOUERE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	5.00	Terre végétale et formation superficielle altérée
5.00	100.00	Syndical de Bouère : Silstones décarbonatés de couleur rouille - Tournaisien (Formation de Grez-en-Bouère)

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	100.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	30.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
30.00	100.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			


FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 1/1  
du : 01/06/2024 au : 01/06/2024

Client :  
Maitre d'oeuvre :  
Localisation de l'ouvrage :  
53290 BOUERE

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert-93 métrique  
Longitude (X): 440 417  
Latitude (Y): 6 755 486  
Altitude sol (Z): +87,400 m

Echelle : 1/503 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 1

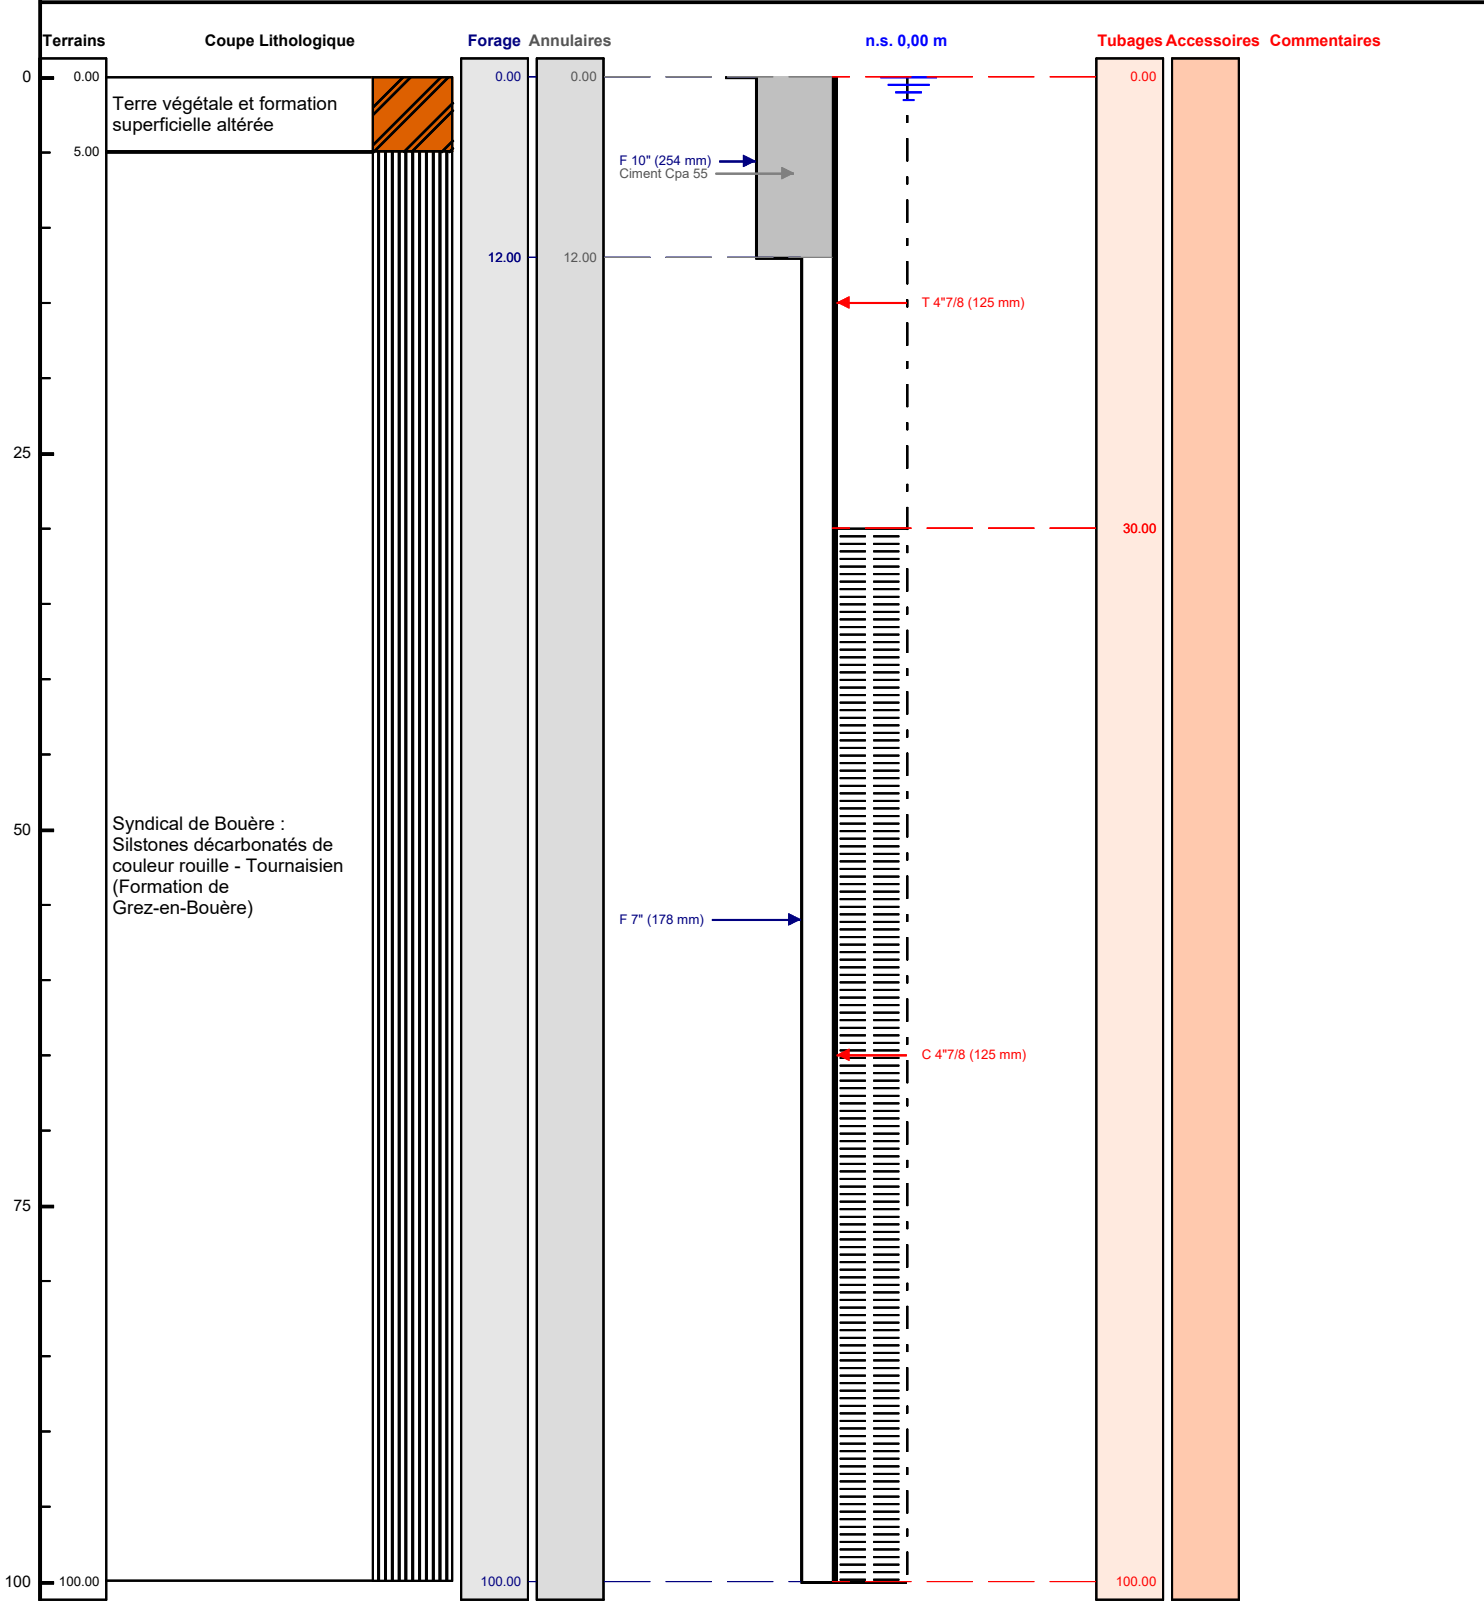

Le ...../...../..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise
